

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2012년~2021년)	추진중	32,200백만원 (국10,050 도4,288 시17,862)	10%	체육진흥과
담당자	과장 : 안진용(☎639-3800) 팀장 : 이석희(☎3811) 주무관 : 한상민(☎3813)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 이산면 운문리●신천리 일원
- 사업기간 : 2012~2020
- 사업규모 : 292,600m²
- 총사업비 : 32,200백만원

2 사업내용

- 체육시설 : 축구장 3, 야구장 2, 풋살장 3, 족구장 2, BMX경기장 1, 인공암벽장, 놀이터
- 기반시설 : 주차장, 도로, 하수처리시설, 상하수도관로 등

3 추진상황

- 2015. 5월 : 경상북도 투융자심사(조건부)
- 2016. 12월 : 발전촉진형 지역개발계획 승인
- 2017. 8월 : 실시설계 용역착수(전체부지정지 및 체육시설)
- 2017. 10월~12월 : 문화재, 교통, 환경, 공공측량, 지반조사 용역 시행
- 2018. 2월 : 지역개발사업구역지정(안) 보고
- 2018. 8월 : 도입시설 최종안 결정
- 2018. 10월 : 도 균형개발과 사전협의(구역지정 및 계획승인)
- 2019. 1월 : 국토교통부 지역정책과 업무협의(사전타당성평가 관련)
- 2019. 2월 : 부지보상 83%(전체 120필지 292,600m², 사유지 31필지 48,336m²)

4 향후 추진계획


- 2019. 3월 : 지역개발구역지정 및 실시계획 승인신청
- 2019. 7월 : 지역개발구역지정 및 실시계획 승인완료
- 2019. 8월 : 각종 용역 완료 및 사업 계약
- 2019. 9월 : 사업 착공 및 선급금 지급
- 2021. 12월 : 사업 준공 및 운영

5 투자계획 및 예산확보 현황


(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	32,200	10,050	4,288	17,862		11,010	2,950	3,428	4,632		
기투자	9,360	1,300	3,428	4,632		9,360	1,300	3,428	4,632		
2019	1,650	1,650	-	-		1,650	1,650	-	-		
2020이후	21,190	7,100	860	13,230		-	-	-	-		

6 사업추진 사진 등

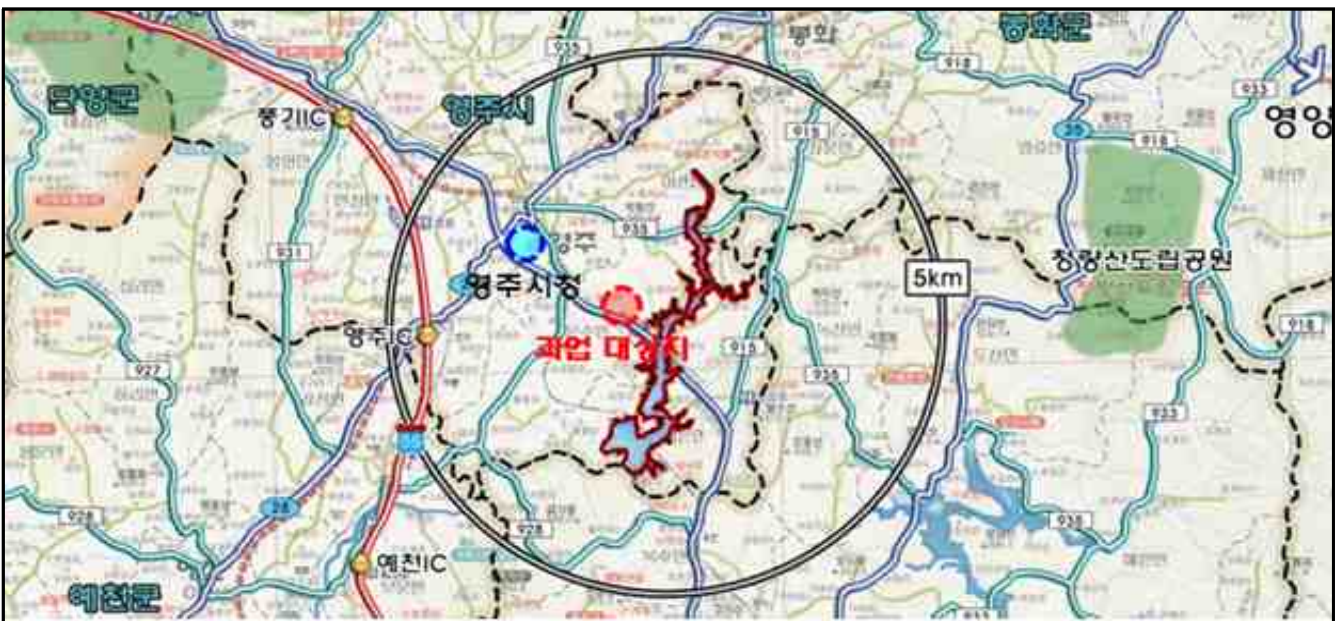

<스포츠 콤플렉스 사업 대상지 위치도>

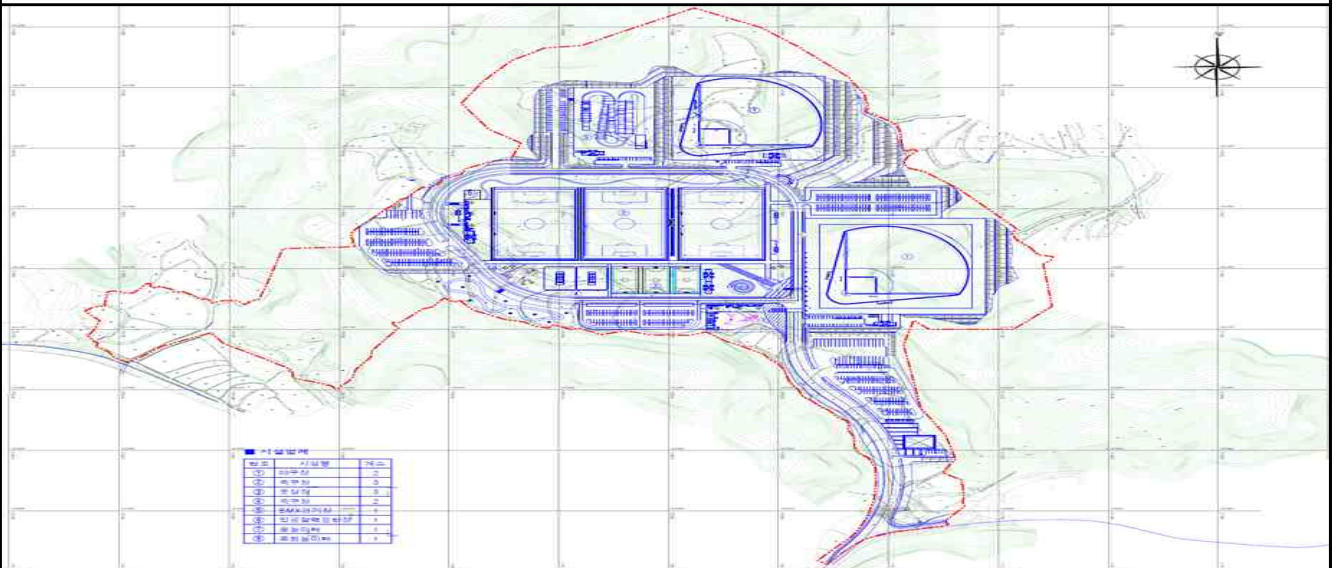

<도입시설 최종안>
