

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년~2021년)	추진중	8,510백만원 (국 250, 시 8,260)	25%	건설과 농업기반팀
담당자	과장:조운현(☎639-6700) 팀장:신상철(☎6731) 주무관:나효순(☎6732)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 이산면, 평은면, 문수면 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 8,510백만원(2019년 1,757백만원)
- 사업내용 : 취수탑설치 3개소, 송수관로설치 23.1km

2 사업내용

사 업 명 (수혜면적:286.7ha)	위 치	사 업 내 용	사 업 비 (백 만 원)			비고	
			합 계	국비	도비		시비
합 계 (5)			8,510	250		8,260	
영주댐 수몰지내 취수탑설치공사(106)	평은면 문수면	취수탑 2개소 (H=28m, D=5m)	1,800			1,800	완 료
문수면 만방리 송수관로 설치(30.5)	문수면 만방리	송수관로 L=5.8km	1,810			1,810	발 주 예 정
평은면 평은리 송수관로 설치(75.7)	평은면 평은,천본리	송수관로 L=9.8km	2,300			2,300	발 주 예 정
평은면 동막취수탑 설치(30)	평은면 강동,오운	취수탑설치 1개소 송수관로 L=2.0km	1,860	250		1,610	용역 중 용역 중
운문양수장 용수공급구역 확장(42)	이산 운문 문수 적동	용수공급시설 설치 L=5.5km	740			740	용역 중

3 추진상황

- '17. 3월 : 영주댐 수몰지 내 취수탑설치공사(평은·새배이) 발주 및 착공
(2018. 4. 준공)
- '17. 11월 : 문수면 만방리, 평은면 평은리·천본리 송수관로설치공사 기본 및 실시
설계용역 시행
- '18. 3월 : 용역과제 심의회 심의의결(동막취수탑설치)
- '18. 9월 : 운문양수장 용수공급구역 확장 및 동막취수탑설치공사 기본 및 실시
설계용역 시행

4 향후 추진계획


- '19. 2월 : 기술자문위원회 기술심의(문수면 만방리 및 평은면 평은리 송수관로설치
공사)
- '19. 3월 : 문수면 만방리 및 평은면 평은리 송수관로설치공사 시행('20.12월 준공)
- '19. 8월 : 운문양수장 용수공급구역 확장 및 동막취수탑설치공사 기본 및 실시
설계용역 완료(기술자문심의 포함)
- '19. 9월 : 운문양수장 용수공급구역 확장 및 동막취수탑설치공사 시행
('21.3월 준공)

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	8,510	250		8,260		5,767	250		5,517		
기투자	4,010			4,010		4,010			4,010		
2019	1,757	250		1,507		1,757	250		1,507		
2020이후	2,743			2,743							

6 사업추진 사진 등

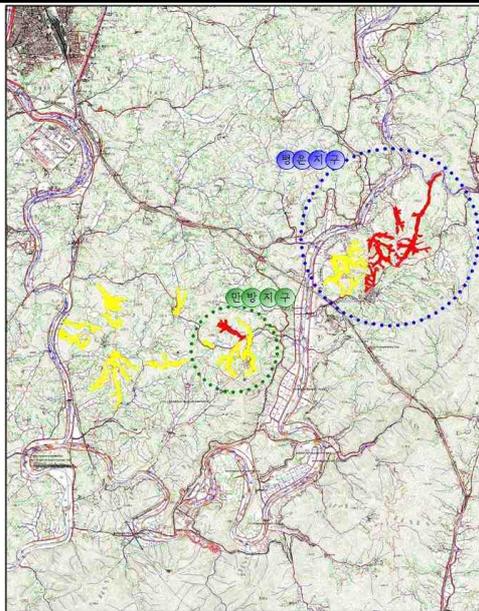

문수면 만방리, 평은면 평은리·천본리 송수관로설치



운문양수장 용수공급구역 확장



동막취수탑설치
