

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2023년)	추진중	50,000백만원 (국25,000 도 12,500 시 12,500)	5%	문화예술과 문화재관리팀
담당자	과장:유선호(☎639-6560) 팀장:김창현(☎639-6581) 주무관:류지환(☎639-6582)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면 읍내리내죽라태장라배점리 일원

2 사업내용

- 고분벽화박물관 건립, 고분벽화테마길 및 고분산책로 조성, 비봉산성 및 고분군 복원 정비, 순흥역사유적 연계벨트화 및 활성화 등

3 추진상황

- '18. 4. 16. : 벽화고분 주변 정밀지표조사 착수
- '18. 10. 12. : 벽화고분 주변 정밀지표조사 완료
- '19. 1. 4. : 순흥 고분벽화 역사문화벨트 조성 기본계획수립 용역 착수

4 향후 추진계획


- '19~'20년 : 각종 사업계획 승인 및 인·허가, 국비확보, 실시설계 용역
- '21~'23년 : 사업시행

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	50,000	25,000	12,500	12,500							
기투자											
2019											
2020이후	50,000	25,000	12,500	12,500							

6 사업추진 사진 등

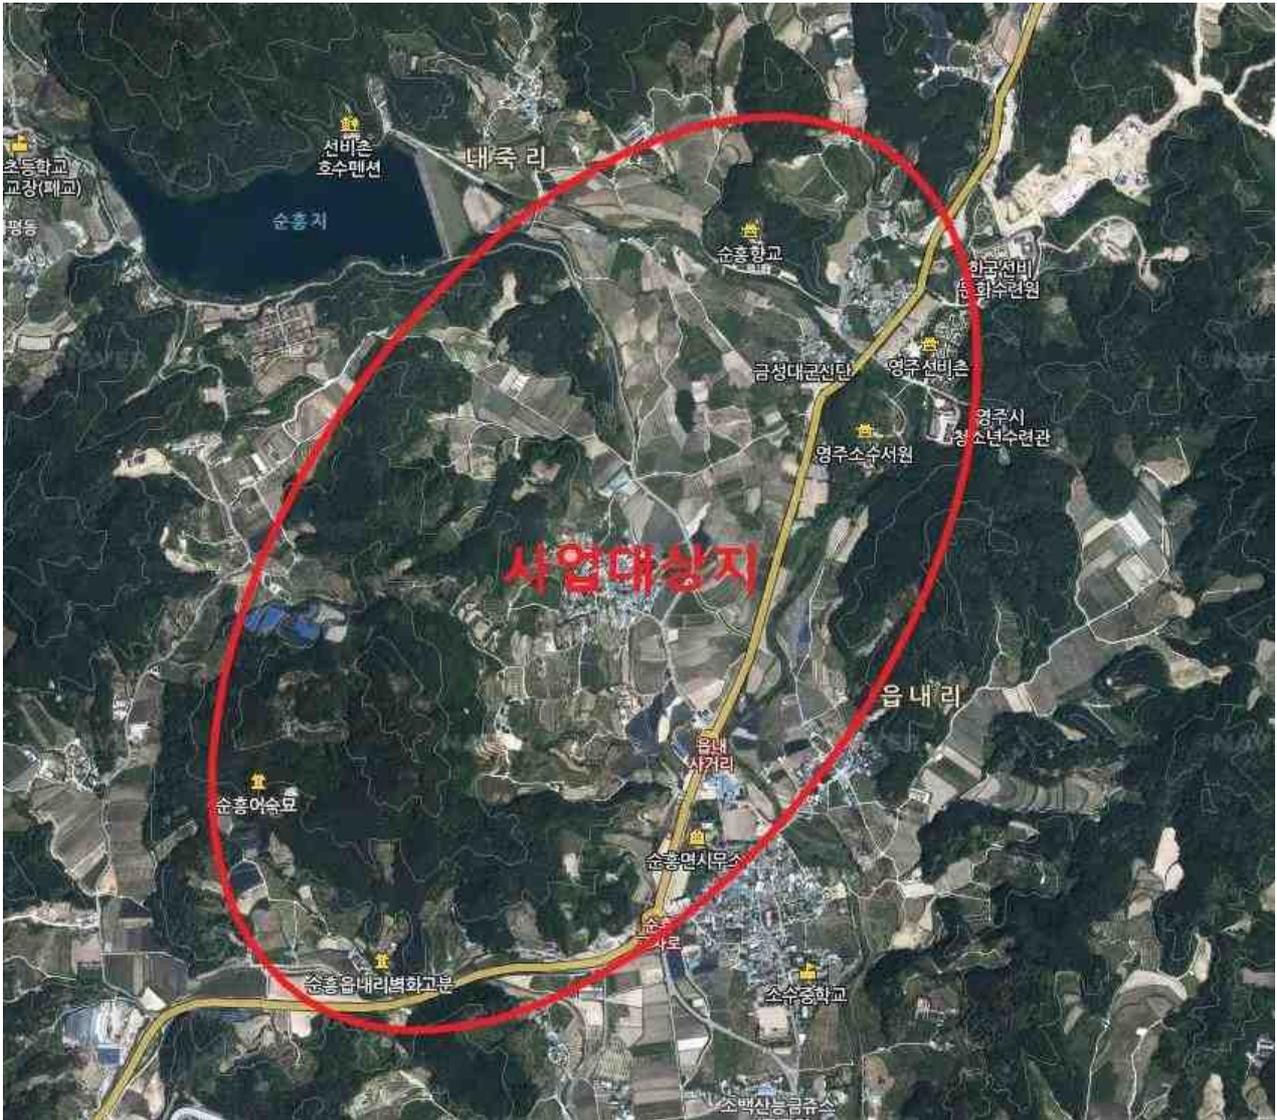

위치도
