

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2020년~2024년)	추진중	25,200백만원 (국 15,000 시 10,200)	3%	도시과
담당자	과장:배종태(☎639-6670) 팀장:황만기(☎6691) 주무관:김도현(☎6692)				

## 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 휴천2동(영주역 주변)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 총사업비 : 25,200백만원(국비 15,000, 지방비 10,200)

## 2 사업유형

- 중심시가지형

## 3 추진상황

- 2018. 5. 11 도시재생활성화계획수립용역 착수
- 2018. 8. 23 도시재생활성화계획수립용역 착수보고회
- 2018. 11. 14 도시재생대학 개강
- 2019. 1. 14 도시재생활성화계획수립용역 중간보고회

## 4 향후 추진계획

- 2019. 10월 : 주민추진위원회 및 거버넌스 구축
- 2020. 2월 : 도시재생뉴딜사업 공모 신청(국토교통부)
- 2020년 : 사업 착수
- 2024년 : 사업 준공

## 5 투자계획 및 예산확보 현황


(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	25,200	15,000		10,200					180		
기투자	180			180					180		
2019	20			20							
2020이후	25,000	15,000		10,000							

## 6 사업추진 사진 등



사업구상도

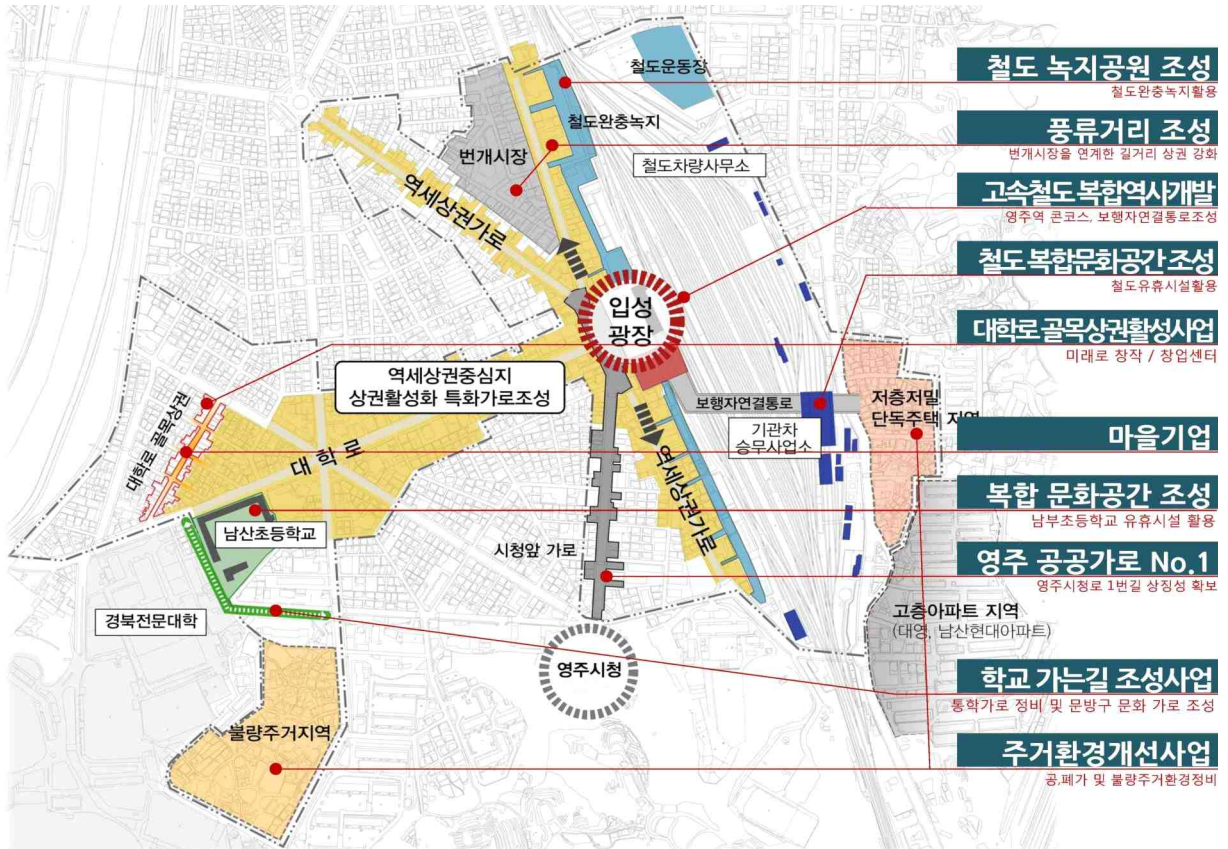

영주역 주변 도시재생전략계획도
