

도시재생사업 시행

관리번호	3-5		추진현황	진도
사업명	도시재생(선도)사업		추진중	70%
담당부서	도시과 도시재생팀	담당자	박종호, 이홍승(☎6693)	

■ 사업개요

- 위치 : 영주시 영주1동, 영주2동 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2017년(4년간)
- 사업비 : 201억원(국비 100.5, 도비 15.2 시비 85.3)
- 사업내용
 - 후생시장 : 근대경관 조성, 들꽃방송, 게스트하우스, 추억의공방만들기 등
 - 중앙시장 : 청년창업지원센터, 지하주차장 확장 및 환경개선사업 등
 - 구성마을 : 구성마을 환경개선, 동네집수리센터, 할머니목공장운영 등
 - 영주옛길 탐방로 운영(조선시대 유교문화부터 근대시장까지 연계)


■ 추진상황(실적)

- 2014. 05. 07 : 도시재생 선도지역 지정고시
- 2014. 07. 22 : 도시재생사업 출범식 개최
- 2014. 08. 14 : 총괄 및 권역별 코디네이터 위촉
- 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획 승인(도시재생특별위원회)
- 2015. 04. 21 : 도시재생지원센터 개소식
- 2015. 10. 30 : 중앙시장 글로컬 축제
- 2015. 12. 18 : 후생시장 근대경관복원사업 시행
- 2016. 1 ~ 12 : 도시재생주민제안공모사업 시행
- 2016. 6. 29 : 구성마을 할머니목공장 준공
- 2016. 10. 30 : 구성마을 소셜다이닝 준공
- 2016. 11. 11 : 구성마을 성아래목공소 준공

■ 향후 추진계획

- 2016. 12. : 구성마을 순환형 임대주택 준공
- 2016. 12. : 중앙시장 지하주차장 리모델링공사 준공
- 2017. 8. : 중앙시장 외관정비공사 준공
- 2016 ~ 2017 : 주민역량강화 및 프로그램 운영

사업추진 내용 및 결과물

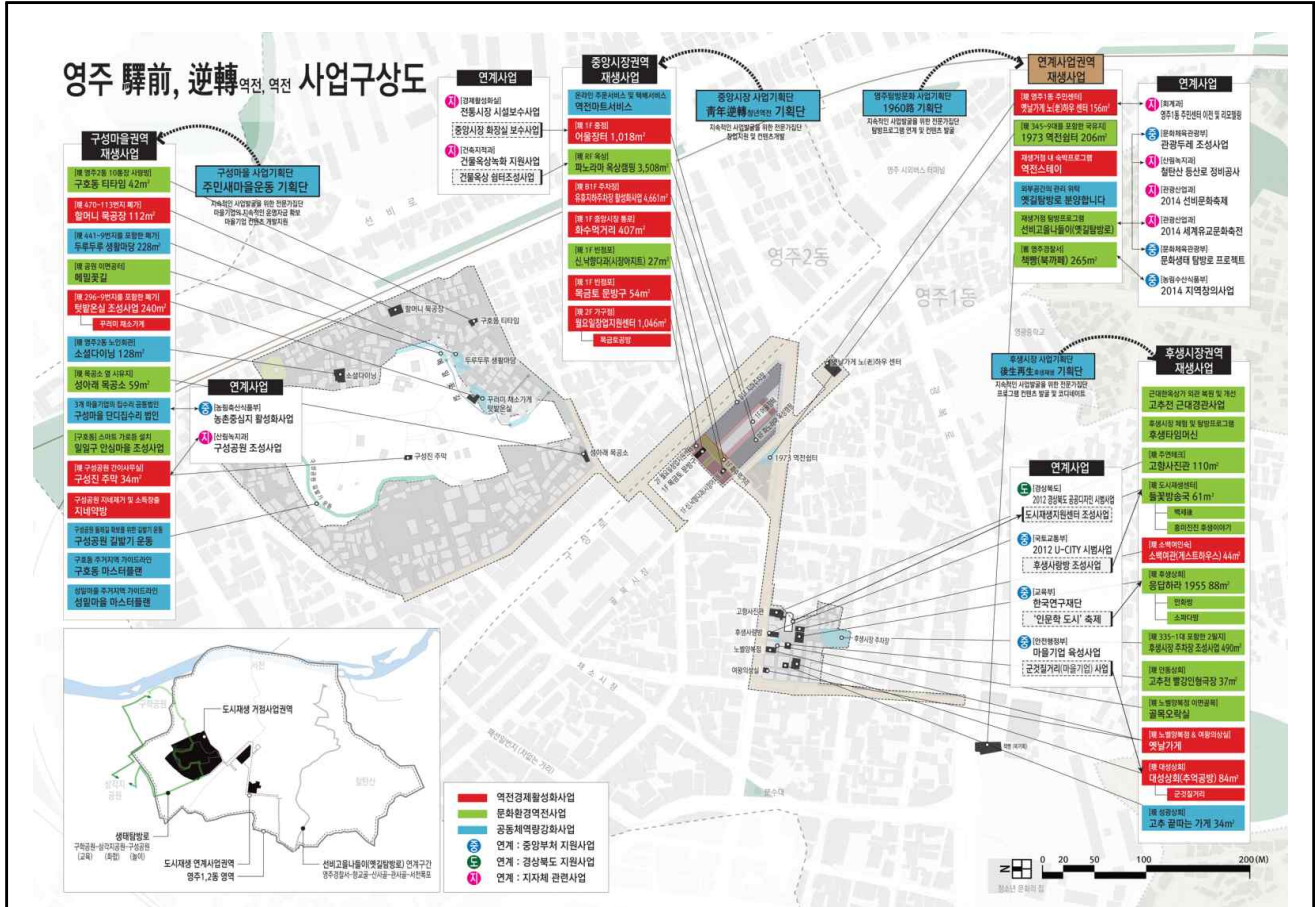

<도시재생사업 사업계획도>

담당부서	도시과	과장	서병규	☎639-6670
		도시재생팀장	박종호	☎639-6660
		주무관	이홍승	☎639-6693
