

근대문화 경관사업

| | | | |
|------|------------|------|-----------------|
| 관리번호 | 3-6 | | |
| 사업명 | 근대문화 경관사업 | 추진현황 | 진도 |
| | | 추진중 | 80% |
| 담당부서 | 도시과 공공디자인팀 | 담당자 | 박종호, 이홍승(☎6693) |

■ 사업개요

- 위치 : 영주시 영주1동 일원(도시재생 선도사업 지구내)
- 사업기간 : 2014 ~ 2017년(4년간)
- 사업비 : 76억원(국비 38, 도비 12, 시비 26)
- 사업내용 : 근대경관 조성, 들꽃방송, 게스트하우스, 추억의공방만들기 등


■ 추진상황(실적)

- 2014. 05. 07 : 도시재생 선도지역 지정고시
- 2014. 07. 22 : 도시재생사업 출범식 개최
- 2014. 08. 14 : 총괄 및 권역별 코디네이터 위촉
- 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획 승인(도시재생특별위원회)
- 2015. 04. 21 : 도시재생지원센터 개소식
- 2015. 06. 08 : 후생시장 근대경관 복원공사 설계용역 착수
- 2015. 07. 23 : 후생시장 매입건물 철거 완료
- 2015. 12. 18 : 후생시장 근대경관 복원공사 착공
- 2016. 10. 14 : 황금시대방송국 내부시설 준공

■ 향후 추진계획

- 2016. 01 ~ 2017. 02 : 후생시장 근대경관 복원공사 준공
- 2017. 06 : 후생시장 소백여관(게스트하우스) 준공
- 2017. 01 ~ 12 : 주민역량강화 및 프로그램 운영

■ 사업추진 내용 및 결과물

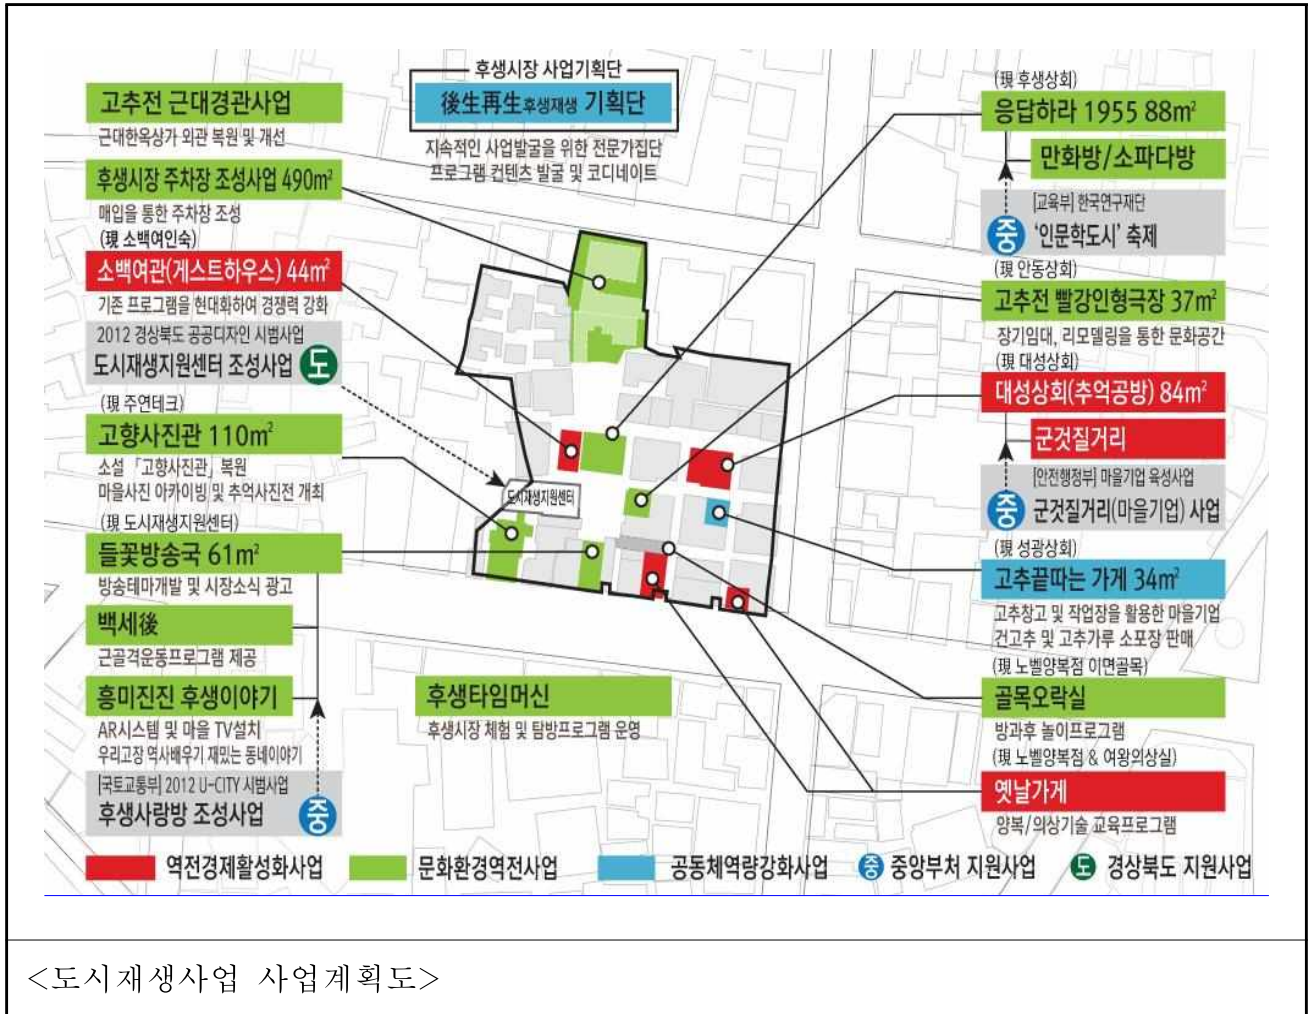

| | | | | |
|------|-----|--------|-----|-----------|
| 담당부서 | 도시과 | 과장 | 서병규 | ☎639-6670 |
| | | 도시재생팀장 | 박종호 | ☎639-6660 |
| | | 주무관 | 이홍승 | ☎639-6693 |
