

소백산 문화관광 힐링벨트 조성

관리번호	3-7		
사업명	소백산 문화관광 힐링벨트 조성	추진현황	진도
		추진중	20%
담당부서	새마을관광과 관광마케팅팀	담당자	김명자(☎ 639-6612)

■ 사업개요

- 위 치 : 소백산 주변 일대
 - 소백산 자락길 ↔ 국립산림치유원 ↔ 풍기온천 ↔ 한문화테마파크 ↔ 선비촌 ↔ 전통장류 체험(콩 과학관 등) ↔ 부석사 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업비 : 304,525백만원
- 사업내용 : 관광시설을 활용한 힐링벨트 조성

[신규사업]

- 장수발효 체험마을 조성(90억원/콩과학관치 : 체험시설·숙박촌·산책로 등)
- 힐링벨트 투어 프로그램 운영
 - 선비 문화 투어, 산림 치유 투어, 고택 및 템플 투어

[기 추진중인 사업]

- 문화관광 체험 : 선비촌, 부석사 등 선비 및 불교문화 체험
- 치유 휴양 시설 조성(산림치유원)
- 웰빙 먹거리 타운(한옥형) 조성(규모 13,895 m^2)/한국문화테마파크
- 숙박 및 공공시설(규모40,009 m^2)/한국문화테마파크

■ 추진상황(실적)

- 한국문화테마파크 조성 : 30%
- 국립산림치유원 : 100%

■ 향후 추진계획

- 2017년~2020년 : 힐링벨트 조성 프로그램 운영 등

■ 문제점 및 대책

- 장수발효 체험마을(90억원) : 국비 미확보→확보위한 다각적인 노력


■ 사업추진 내용 및 결과물



시설물배치도



조감도

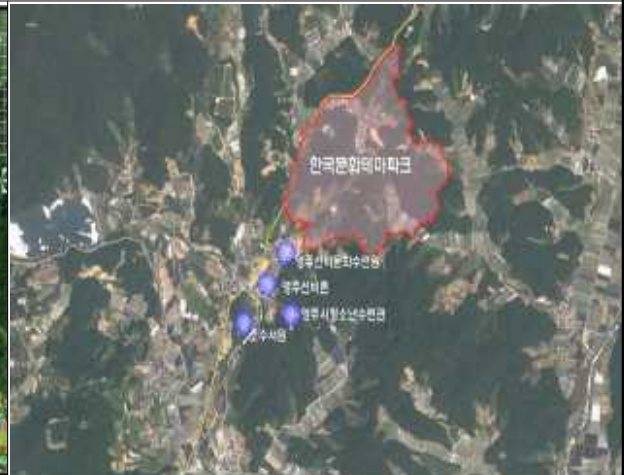

위치도

담당부서	새마을관광과	과 장	박근택	☎ 639-6600
		관광마케팅팀장	김명자	☎ 639-6612
		주무관	박찬민	☎ 639-6613
